ID		タスク名	開始日	終了日	先行タスク
1		そよ風 入金管理システム	08/02/25 (月)	08/05/30 (金)	
2		現行システム調査フェーズ	08/02/25 (月)	08/03/04 (火)	
3		機能調査(ケアセンター)	08/02/25 (月)	08/03/04 (火)	
4		設計フェーズ	08/03/05 (水)	08/04/01 (火)	2
5		DB設計(ケアセンター)	08/03/05 (水)	08/03/12 (水)	
6		機能設計(ケアセンター)	08/03/13 (木)	08/04/01 (火)	5
7		画面設計(ケアセンター)	08/03/05 (水)	08/04/01 (火)	
8		帳票設計(ケアセンター)	08/03/05 (水)	08/03/11 (火)	
9		開発フェーズ	08/03/13 (木)	08/05/05 (月)	
10		起動メニュー	08/04/02 (水)	08/04/04 (金)	
11		メニュー画面	08/04/02 (水)	08/04/02 (水)	7
12		OfficeCode／管理グループ名称設定	08/04/03 (木)	08/04/03 (木)	11
13		管理グループ情報追加	08/04/03 (木)	08/04/03 (木)	12
14		事業所登録	08/04/04 (金)	08/04/04 (金)	13
15		そよ風入金管理システムメニュー	08/04/07 (月)	08/04/09 (水)	14
16		利用者選択	08/04/10 (木)	08/04/14 (月)	15
17		Weltopia関連	08/04/15 (火)	08/05/05 (月)	
18		利用者情報取得	08/04/15 (火)	08/04/21 (月)	16
19		利用者管理	08/04/22 (火)	08/04/23 (水)	18
20		返戻請求処理	08/04/24 (木)	08/04/29 (火)	19
21		請求データ作成	08/04/30 (水)	08/05/05 (月)	20
22		保険外サービス処理	08/04/01 (火)	08/04/07 (月)	
23		保険外サービス処理－登録	08/04/01 (火)	08/04/03 (木)	
24		保険外サービス処理－追加	08/04/04 (金)	08/04/04 (金)	23
25		保険外サービス処理－修正	08/04/04 (金)	08/04/04 (金)	24
26		保険外サービス処理－削除	08/04/07 (月)	08/04/07 (月)	25
27		入居金償却費処理	08/04/07 (月)	08/04/18 (金)	
31		入金処理	08/04/18 (金)	08/04/24 (木)	
32		入金処理	08/04/18 (金)	08/04/22 (火)	30
33		入金明細	08/04/22 (火)	08/04/24 (木)	32
34		入金明細入力・修正	08/04/24 (木)	08/04/24 (木)	33
35		預入処理	08/04/25 (金)	08/05/05 (月)	
36		預入処理	08/04/25 (金)	08/04/28 (月)	34
37		預入処理－－覧	08/04/29 (火)	08/04/29 (火)	36
38		預入処理登録	08/04/30 (水)	08/05/05 (月)	37
39		入居金管理	08/03/13 (木)	08/03/17 (月)	8
40		売上実績	08/03/18 (火)	08/03/21 (金)	39
41		売掛金台帳出力	08/03/24 (月)	08/03/27 (木)	40
42		保険分入金処理	08/03/28 (金)	08/03/31 (月)	41
43		未収管理	08/04/01 (火)	08/04/04 (金)	42
44		入金管理表印刷	08/04/07 (月)	08/04/09 (水)	43
45		請求書・領収書印刷	08/04/10 (木)	08/04/21 (月)	
46		請求書・領収書の確認・印刷	08/04/10 (木)	08/04/16 (水)	44
47		請求書・領収書の一括印刷	08/04/17 (木)	08/04/21 (月)	46
48		保険請求データ取得	08/04/22 (火)	08/04/23 (水)	47
49		HULFT関連	08/04/01 (火)	08/05/01 (木)	
50		口座振替結果取得	08/04/01 (火)	08/04/02 (水)	
51		請求データ締め送信	08/04/03 (木)	08/04/07 (月)	50
52		請求データ締め解除	08/04/08 (火)	08/04/09 (水)	51
53		請求データ解除応答取込	08/04/10 (木)	08/04/11 (金)	52
54		入金データ送信	08/04/14 (月)	08/04/16 (水)	53
55		入金データ締め送信	08/04/17 (木)	08/04/18 (金)	54
56		入金データ締め解除	08/04/21 (月)	08/04/22 (火)	55
57		入金データ解除応答取込	08/04/23 (水)	08/04/24 (木)	56
58		マスタ取得	08/04/25 (金)	08/05/01 (木)	57
59		テストフェーズ	08/05/06 (火)	08/05/23 (金)	
60		結合テスト1	08/05/06 (火)	08/05/23 (金)	9
61		結合テスト2	08/05/06 (火)	08/05/23 (金)	9
62		現地調整	08/05/26 (月)	08/05/30 (金)	61,60
63		現地調整1	08/05/26 (月)	08/05/30 (金)	
64		現地調整2	08/05/26 (月)	08/05/30 (金)	

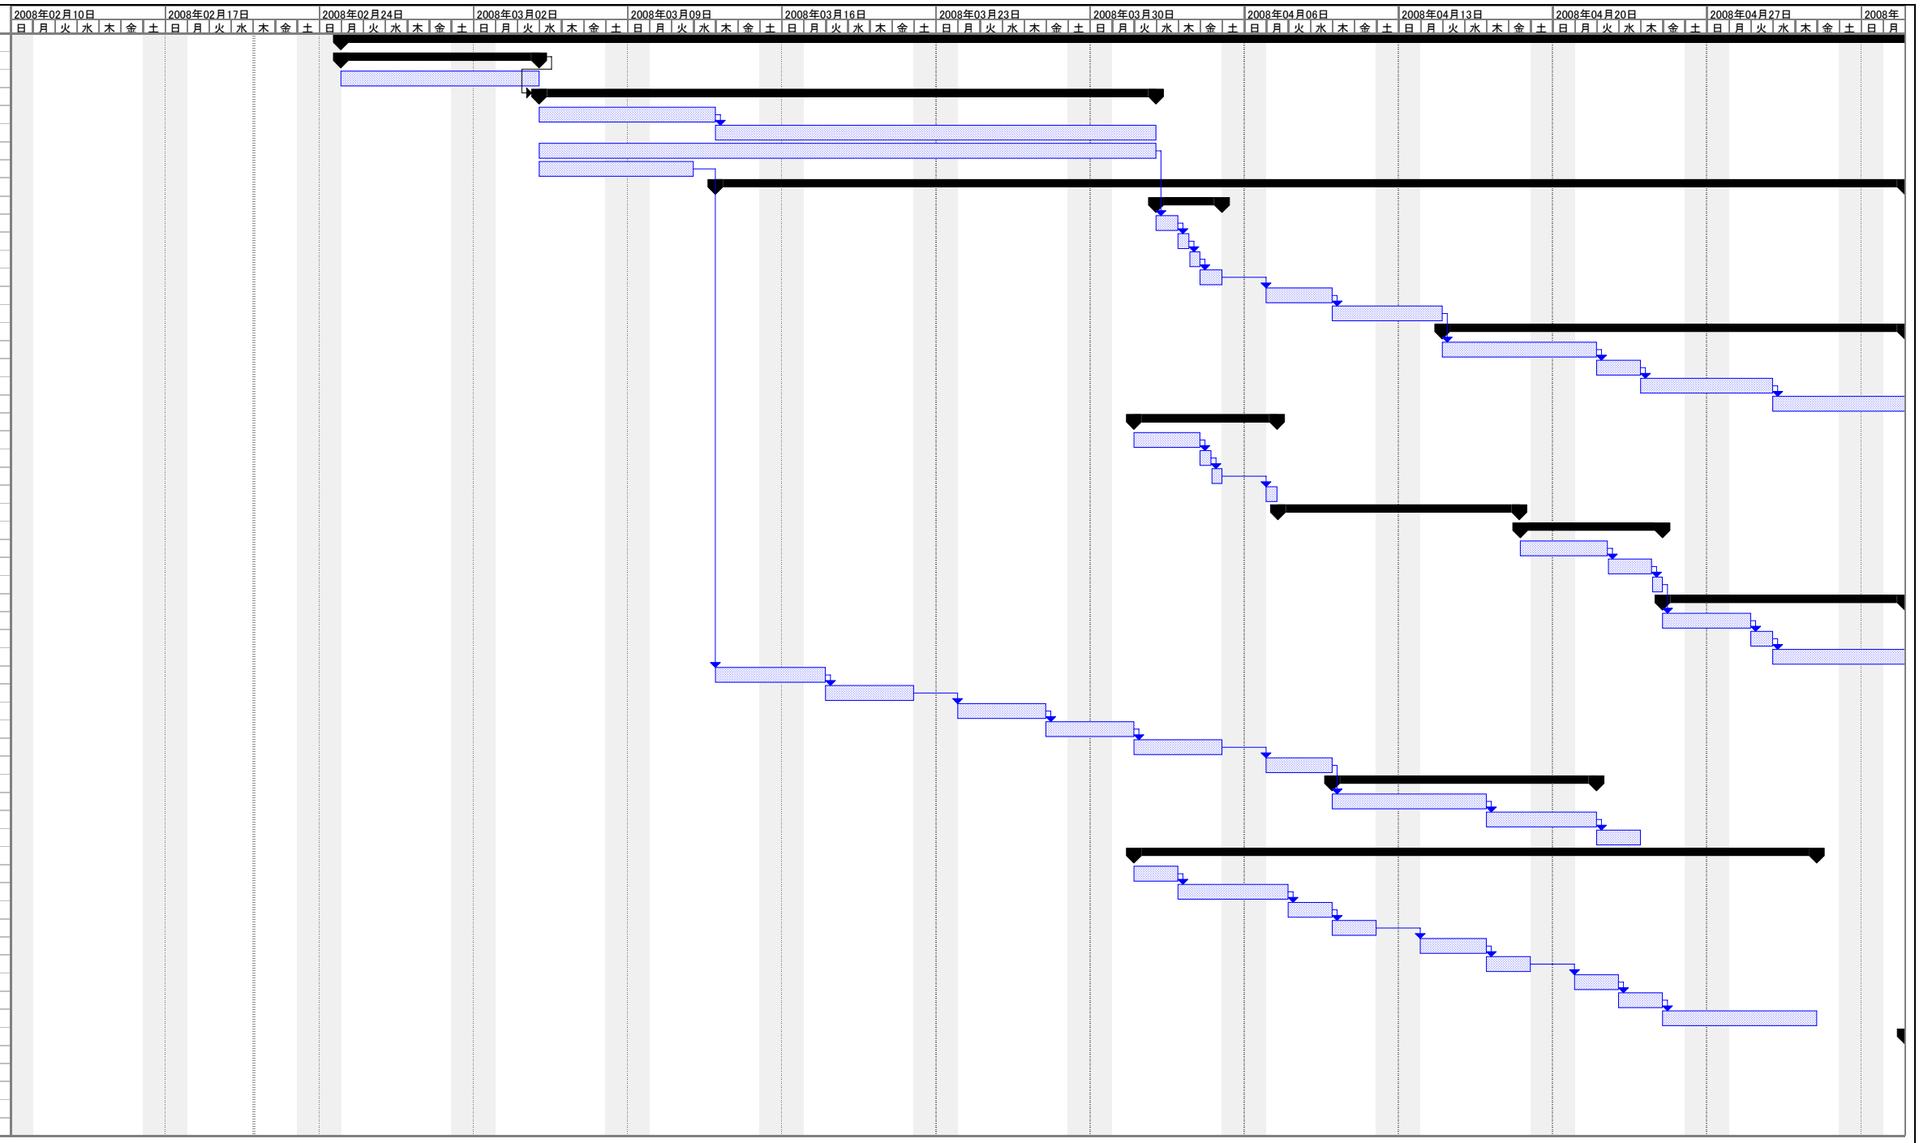

プロジェクト：D:¥Jobs¥Workspace¥pk
日付：08/02/21 (木)

タスク　進捗状況　サマリー タスク　グループ サマリー　重ね合わせた分割　重ね合わせたタスクの進捗状況　外部マイルストーン
分割　マイルストーン　プロジェクトのサマリー　重ね合わせたタスク　重ね合わせたマイルストーン　外部タスク　期限

プロジェクト：D:¥Jobs¥Workspace¥pk
日付：08/02/21（木）

タスク		進捗状況		サマリー タスク		グループ サマリー		重ね合わせた分割		重ね合わせたタスクの進捗状況		外部マイルストーン	
分割		マイルストーン		プロジェクトのサマリー		重ね合わせたタスク		重ね合わせたマイルストーン		外部タスク		期限	
